Bauablaufplan Projekt Fertigteilbau
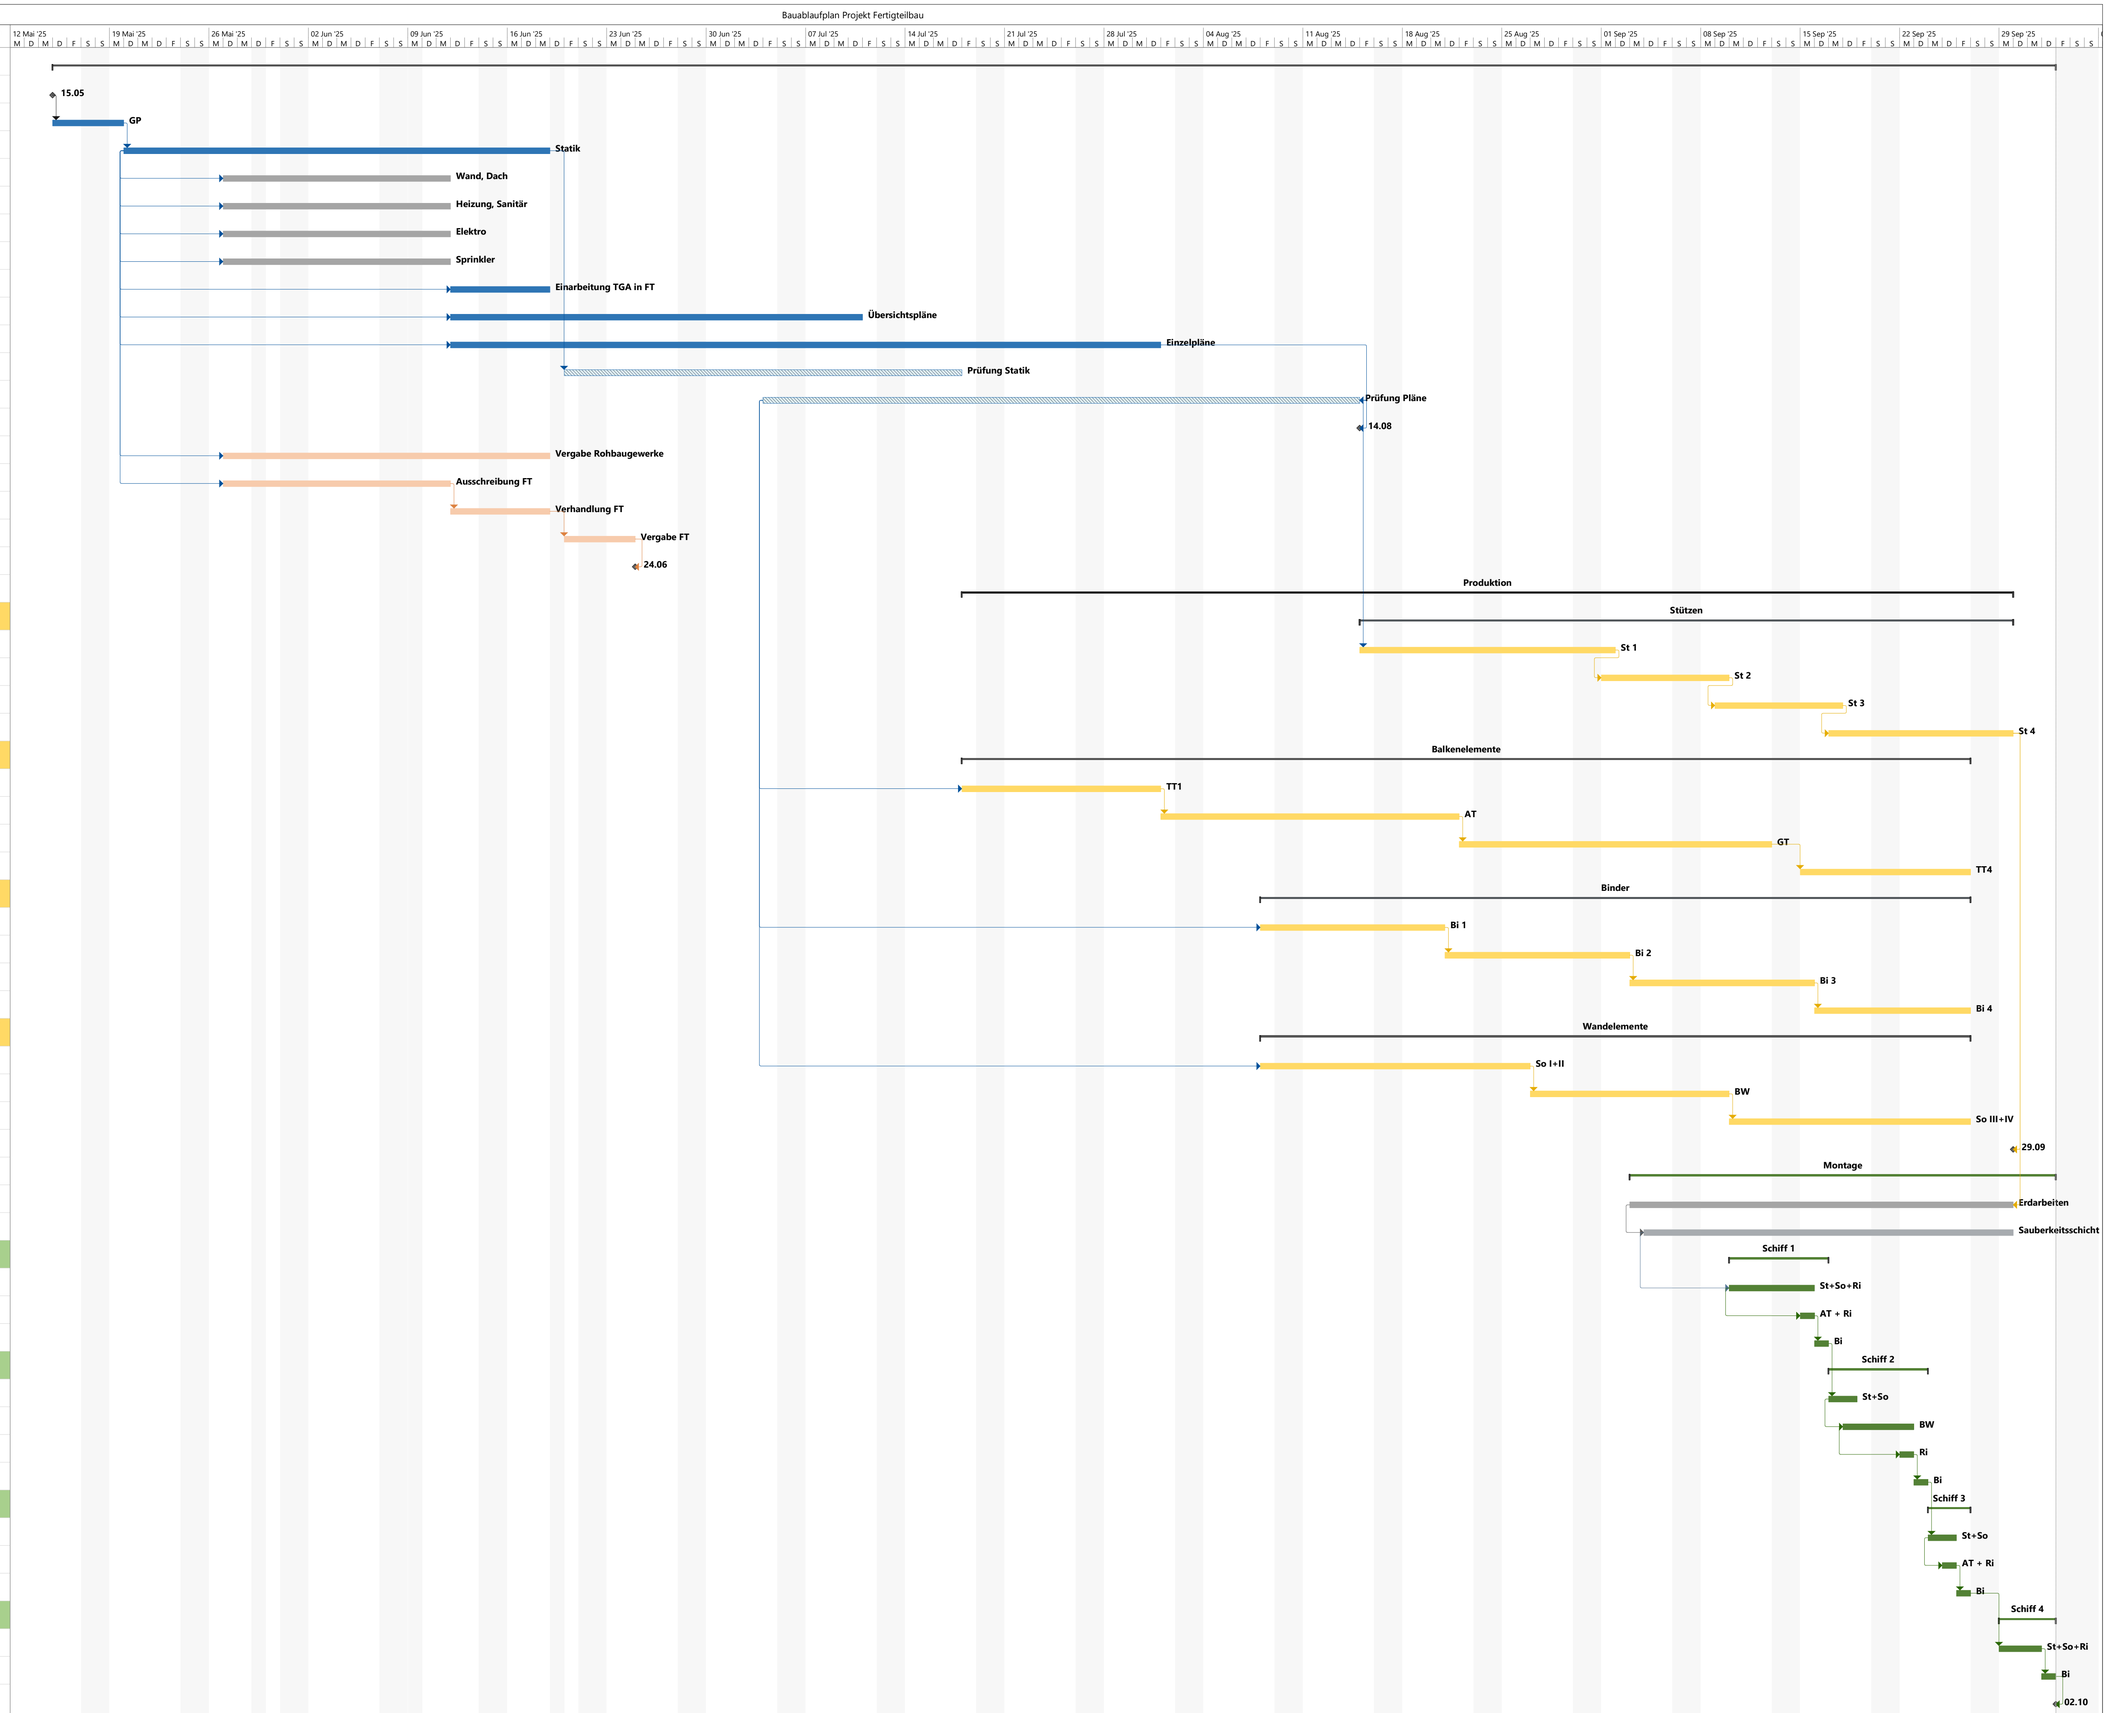
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Stück	Produktion
1	**Betonfertigteihalle**	**98 Tage**	**Don 15.05.25**	**Don 02.10.25**		
2	Vergabe Bauherr	0 Tage	Don 15.05.25	Don 15.05.25		
3	Grundlagenermittlung	3 Tage	Don 15.05.25	Mon 19.05.25		
4	Statik	20 Tage	Die 20.05.25	Mit 18.06.25		
5	Planung: Wand, Dach	10 Tage	Die 27.05.25	Mit 11.06.25		
6	Planung: Heizung, Sanitär	10 Tage	Die 27.05.25	Mit 11.06.25		
7	Planung: Elektro	10 Tage	Die 27.05.25	Mit 11.06.25		
8	Planung: Sprinkler	10 Tage	Die 27.05.25	Mit 11.06.25		
9	Einarbeitung TGA in FT	5 Tage	Don 12.06.25	Mit 18.06.25		
10	Übersichtspläne	20 Tage	Don 12.06.25	Don 10.07.25		
11	Einzelpläne	35 Tage	Don 12.06.25	Don 31.07.25		
12	Prüfung Statik	20 Tage	Fre 20.06.25	Don 17.07.25		
13	Prüfung Pläne	30 Tage	Fre 04.07.25	Don 14.08.25		
14	Fertige & Geprüfte Planung	0 Tage	Don 14.08.25	Don 14.08.25		
15	Vergabe Rohbaugewerke	15 Tage	Die 27.05.25	Mit 18.06.25		
16	Ausschreibung Fertigteilbauwerke	10 Tage	Die 27.05.25	Mit 11.06.25		
17	Verhandlung Fertigteilbauwerke	5 Tage	Don 12.06.25	Mit 18.06.25		
18	Vergabe Fertigteilbauwerke	3 Tage	Fre 20.06.25	Die 24.06.25		
19	Beauftragung Fertigteilwerk	0 Tage	Die 24.06.25	Die 24.06.25		
20	**Produktion**	**52 Tage**	**Fre 18.07.25**	**Mon 29.09.25**		
21	**Stützen**	**32 Tage**	**Fre 15.08.25**	**Mon 29.09.25**	**64**	**2 St. / AT**
22	Stützen Schiff 1	12 Tage	Fre 15.08.25	Mon 01.09.25		
23	Stützen Schiff 2	7 Tage	Mon 01.09.25	Die 09.09.25		
24	Stützen Schiff 3	7 Tage	Die 09.09.25	Mit 17.09.25		
25	Stützen Schiff 4	9 Tage	Mit 17.09.25	Mon 29.09.25		
26	**Balkenelemente**	**51 Tage**	**Fre 18.07.25**	**Fre 26.09.25**	**51**	**1 St. / AT**
27	Traufträger Schiff 1	10 Tage	Fre 18.07.25	Don 31.07.25		
28	Abfangträger	15 Tage	Fre 01.08.25	Don 21.08.25		
29	Giebelträger	16 Tage	Fre 22.08.25	Fre 12.09.25		
30	Traufträger Schiff 4	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25		
31	**Binder**	**36 Tage**	**Fre 08.08.25**	**Fre 26.09.25**	**36**	**1 St. / AT**
32	Binder Schiff 1	9 Tage	Fre 08.08.25	Mit 20.08.25		
33	Binder Schiff 2	9 Tage	Don 21.08.25	Die 02.09.25		
34	Binder Schiff 3	9 Tage	Mit 03.09.25	Mon 15.09.25		
35	Binder Schiff 4	9 Tage	Die 16.09.25	Fre 26.09.25		
36	**Wandelemente**	**36 Tage**	**Fre 08.08.25**	**Fre 26.09.25**	**72**	**2 St. / AT**
37	Sockel Schiff 1 +2	13 Tage	Fre 08.08.25	Die 26.08.25		
38	Brandschutzwand	10 Tage	Mit 27.08.25	Die 09.09.25		
39	Sockel Schiff 3 +4	13 Tage	Mit 10.09.25	Fre 26.09.25		
40	Ende der Produktion	0 Tage	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25		
41	**Montage**	**22 Tage**	**Mit 03.09.25**	**Don 02.10.25**		
42	Erdarbeiten	19 Tage	Mit 03.09.25	Mon 29.09.25		
43	Sauberkeitsschicht	18 Tage	Don 04.09.25	Mon 29.09.25		
44	**Schiff 1**	**5 Tage**	**Mit 10.09.25**	**Die 16.09.25**		
45	Stützen + Sockel + Traufriegel	4 Tage	Mit 10.09.25	Mon 15.09.25		
46	Abfangträger + Giebelträger	1 Tag	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25		
47	Binder	1 Tag	Die 16.09.25	Die 16.09.25		
48	**Schiff 2**	**5 Tage**	**Mit 17.09.25**	**Die 23.09.25**		
49	Stützen + Sockel	2 Tage	Mit 17.09.25	Don 18.09.25		
50	Brandschutzwand	3 Tage	Don 18.09.25	Mon 22.09.25		
51	Giebelriegel	1 Tag	Mon 22.09.25	Mon 22.09.25		
52	Binder	1 Tag	Die 23.09.25	Die 23.09.25		
53	**Schiff 3**	**3 Tage**	**Mit 24.09.25**	**Fre 26.09.25**		
54	Stütze + Sockel	2 Tage	Mit 24.09.25	Don 25.09.25		
55	Abfangträger + Giebelriegel	1 Tag	Don 25.09.25	Don 25.09.25		
56	Binder	1 Tag	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25		
57	**Schiff 4**	**4 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Don 02.10.25**		
58	Stütze + Sockel + Riegel	3 Tage	Mon 29.09.25	Mit 01.10.25	> 0,88 h pro	
59	Binder	1 Tag	Don 02.10.25	Don 02.10.25		
60	Fertigstellung Betonkonstruktion der Halle	0 Tage	Don 02.10.25	Don 02.10.25
